

บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติม

สัญญาจ้างดำเนินการกิจกรรมการยกระดับความพร้อมพื้นที่ชุมชนสหกรณ์เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าไมซ์
(ไมซ์เพื่อชุมชน)

บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติม สัญญาจ้างดำเนินการกิจกรรมการยกระดับความพร้อมพื้นที่ชุมชนสหกรณ์เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าไมซ์ (ไมซ์เพื่อชุมชน) (ซึ่งต่อไปนี้จะขอเรียกว่า “บันทึกข้อตกลง”) ทำขึ้นเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ณ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ตั้งอยู่เลขที่ 989 สยามพิวรรณ์ทาวเวอร์ ชั้น 25 และ ชั้น 26 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ระหว่าง

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 989 อาคารสยามพิวรรณ์ทาวเวอร์ ชั้น 25 และ ชั้น 26 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดย นายจิรุตม์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ผู้มีอำนาจกระทำการแทน ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงจะเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ


บริษัท อินดีด ครีเอชั่น จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท เชียงใหม่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ 500/61 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดย นางสาวอนรรักษ์ อินชืน ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่คู่สัญญาได้ทำสัญญาจ้างดำเนินการกิจกรรมการยกระดับความพร้อมพื้นที่ชุมชนสหกรณ์เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าไมซ์ (ไมซ์เพื่อชุมชน) รายละเอียดตามสัญญาเลขที่ 64-023 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2564 ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า “สัญญาจ้าง” นั้น

เนื่องด้วย ตามขอบเขตการดำเนินงานผู้รับจ้างจะต้องสำรวจชุมชนและสหกรณ์ชุมชน และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ในพื้นที่ดำเนินการ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ยังคงระบาดอย่างต่อเนื่อง เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการลงพื้นที่ เพื่อสำรวจชุมชนและ



indeed
CREATION CO., LTD.
Inspiring Definitely



Legal

สหกรณ์ชุมชน และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ได้ คู่สัญญาจึงตกลงร่วมกันขยายระยะเวลาดำเนินกิจกรรม ซึ่งการขยายระยะเวลาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อระยะเวลาการดำเนินการตามสัญญาจ้าง และการส่งมอบงานตามสัญญาจ้าง

ดังนั้น คู่สัญญาจึงจัดทำบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ขึ้นเพื่อแก้ไขสัญญาจ้างบางประการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อ 1 คู่สัญญาตกลงขยายระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมตามสัญญาจ้าง จากเดิม 180 วันนับถัดจากวันที่ทำสัญญา เป็น 270 วันนับถัดจากวันที่ทำสัญญา โดยให้ยกเลิกข้อความในข้อ 5 แห่งสัญญาจ้าง และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้บังคับใช้แทน

“ข้อ 5 กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ 16 มีนาคม 2564 และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายใน 270 วันนับถัดจากวันที่ทำสัญญา ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็น ผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของ ผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา”

ข้อ 2 คู่สัญญาตกลงแก้ไขการส่งมอบงานครั้งที่ 2 ถึง ครั้งที่ 4 ที่ระบุไว้ในข้อ 10 ของเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง ผนวก 1 ข้อกำหนดงาน (TOR) กิจกรรมการยกระดับความพร้อมพื้นที่ชุมชนสหกรณ์เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าไมซ์ (ไมซ์เพื่อชุมชน) โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน



รายละเอียดของรายงาน	วันที่ส่งมอบ	ลักษณะของรายงาน
ครั้งที่ 2 รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) ประกอบด้วย - รายงานสรุปผลการลงพื้นที่เพื่อสำรวจชุมชน อย่างน้อย 20 ชุมชน - ร่างรายละเอียด Mood & Tone ของ VDO	ภายใน 270 วันนับ ถัดจากวันที่ทำ สัญญา	1. เล่มรายงานทั้งหมด จำนวน 5 ชุด 2. ไฟล์รายงานบันทึกใน Thumb Drive จำนวน 5 ชุด
ครั้งที่ 3 ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) ประกอบด้วย - รายงานสรุปผลการลงพื้นที่เพื่อสำรวจชุมชนทั้งหมดทั้งหมด 40 ชุมชน - รายงานสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ - ร่างคู่มือ เพื่อประชาสัมพันธ์ (ภาษาไทย) - ร่างสตอรี่บอร์ดของ VDO	ภายใน 270 วันนับ ถัดจากวันที่ทำ สัญญา	1. เล่มรายงานทั้งหมด จำนวน 5 ชุด 2. ไฟล์รายงานบันทึกใน Thumb Drive จำนวน 5 ชุด
ครั้งที่ 4 รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ประกอบด้วย - รายงานสรุปผลโครงการ ทั้ง 20 ชุมชน และแนวทางสำหรับการประชาสัมพันธ์ และขายชุมชนสำหรับการจัดกิจกรรมไมซ์ - เอกสารและสื่อประชาสัมพันธ์ ซึ่งประกอบด้วย คู่มือ และ VDO ตามรายละเอียดข้อ 6.2	ภายใน 270 วันนับ ถัดจากวันที่ทำ สัญญา	1. เล่มรายงานทั้งหมด จำนวน 5 ชุด 2. คู่มือประชาสัมพันธ์ จำนวน 2,000 ชุด(ภาษาไทย 1,000 ชุด ภาษาอังกฤษ 1,000 ชุด) 3. VDO ประชาสัมพันธ์ จำนวน 14 ชุด (ไทยและอังกฤษ) 4. ไฟล์ Artwork เผยแพร่บนเว็บไซต์ 5 ชุด 5. ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ของ 1-5 บันทึกใน Thumb Drive จำนวน 5 ชุด



indeed
CREATION CO., LTD.
Inspiring Definitely

ทั้งนี้ การส่งมอบงานที่ไม่แก้ไข ให้เป็นไปตามข้อ 10 การส่งมอบงานเอกสารแนบแนบท้ายสัญญาจ้างผนวก 1 ข้อกำหนดงาน (TOR) กิจกรรมการยกระดับความพร้อมพื้นที่ชุมชนสหกรณ์เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าไมซ์ (ไมซ์เพื่อชุมชน)

ข้อ 3 คู่สัญญาตกลงให้เอกสารแนบท้ายบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งแห่งบันทึกข้อตกลงนี้

3.1 ผนวก 1 หนังสือบริษัท อินดีดครีเอชั่น จำกัด เรื่อง ขอย้ายระยะเวลาดำเนินงานและแก้ไขการส่งมอบงานกิจกรรมการยกระดับความพร้อมพื้นที่ชุมชนสหกรณ์เพื่อรองรับลูกค้ากลุ่มไมซ์ (ไมซ์เพื่อชุมชน) ปีงบประมาณ 2564 เลขที่ 64-023 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 จำนวน 2 หน้า

3.2 ผนวก 2 หนังสือเลขที่ สสปน. 0339/00487 เรื่อง อนุมัติขยายระยะเวลา และระยะเวลาส่งมอบงานดำเนินกิจกรรมการยกระดับความพร้อมพื้นที่ชุมชนสหกรณ์เพื่อรองรับลูกค้ากลุ่มไมซ์ (ไมซ์เพื่อชุมชน) ปีงบประมาณ 2564 เลขที่ 64-023 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 จำนวน 1 หน้า

ข้อ 4 นอกจากที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้แล้ว เงื่อนไขและข้อตกลงอื่นๆ ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างทุกประการ

ข้อ 5 บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

ข้อ 6 บันทึกข้อตกลง และเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อตกลง ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง

ข้อ 7 หากปรากฏว่ามีข้อความใดในสัญญาจ้าง หรือในเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง หรือในบันทึกข้อตกลงฯ หรือในเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อตกลง ขัดหรือแย้งกัน ผู้รับจ้างตกลงให้ผู้ว่าจ้างเป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาด คำวินิจฉัยชี้ขาดของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุดโดยผู้รับจ้างตกลงจะปฏิบัติตาม คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างโดยเคร่งครัดทุกประการ



indeed
CREATION CO., LTD.
Inspiring Definitely

บันทึกข้อตกลงฯ นี้ได้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามเจตนาของทั้งสองฝ่าย จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา(ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุไว้ข้างต้น และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อผู้ว่าจ้าง

(นายจิรุตม์ อิศรางกูร ณ อยุธยา)

ผู้อำนวยการ


สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
(องค์การมหาชน)

ลงชื่อผู้รับจ้าง

(นางสาวอนรรักษ์ อินชื่น)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท อินดีด ครีเอชั่น จำกัด



indeed
CREATION CO., LTD.
Inspiring Definitely

ลงชื่อพยาน
(นางอุไรลักษณ์ ยะรังษี)
(ผู้จัดการอาวุโส
ส่วนงานกฎหมายและธรรมาภิบาล)

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
(องค์การมหาชน)

ลงชื่อพยาน
(.....)
(.....)

บริษัท อินดีด ครีเอชั่น จำกัด



บริษัท อินดีทรีเอชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
500/61-62 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่เหียะ
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
Tel. 053-224-770, 053-226-533

6 พฤษภาคม 2564

เรื่อง ขอย้ายระยะเวลาดำเนินงานและแก้ไขการส่งมอบงานกิจกรรมการยกระดับความพร้อมพื้นที่ชุมชนสหกรณ์
เพื่อรองรับลูกค้ากลุ่มไมซ์ (ไมซ์เพื่อชุมชน) ปีงบประมาณ 2564 เลขที่ 64-023

เรียน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดการขอย้ายระยะเวลาดำเนินงานและแก้ไขการส่งมอบงาน

ตามที่ บริษัท อินดีทรีเอชั่น จำกัด ได้รับการว่าจ้างให้ดำเนินกิจกรรมการยกระดับความพร้อมพื้นที่ชุมชน
สหกรณ์เพื่อรองรับลูกค้ากลุ่มไมซ์ (ไมซ์เพื่อชุมชน) ปีงบประมาณ 2564 ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ (องค์การมหาชน) (“สสปน.” หรือ “ผู้ว่าจ้าง”) ตามสัญญาจ้างเลขที่ 64-023 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2564
และบริษัทได้ส่งมอบรายงานเบื้องต้น (Inception Report) เรียบร้อยแล้ว นั้น

เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีการระบาดครั้งที่ 3 ใน
ประเทศไทยตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 เป็นต้นมา โดยศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 8 แห่งพระราชกำหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 22) ให้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินใน
ทุกเขตพื้นที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปเป็นระยะอย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 และอาจมีแนวโน้ม
ขยายเวลาออกไปอีกหากสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้น ส่งผลต่อการดำเนินโครงการคือ ทำให้บริษัทไม่สามารถลงพื้นที่เพื่อ
เข้าสำรวจชุมชนได้


จากเหตุผลข้างต้น บริษัท อินดีทรีเอชั่น จำกัด จึงมีจำเป็นต้องขอย้ายระยะเวลาสัญญาการจ้างและขอ
แก้ไขการส่งมอบงาน เพื่อบริษัทจะได้ดำเนินการส่งมอบผลงานที่ครบถ้วน สมบูรณ์ และมีคุณภาพสอดคล้องตาม
ข้อตกลงในสัญญาจ้าง อย่างไรก็ตามทางบริษัทจะไม่มีการคิดเงินค่าจ้างเพิ่มเติมเนื่องมาจากการขยายเวลาตามที่ระบุ
ในจดหมายฉบับนี้แต่อย่างใด โดยรายละเอียดการขอย้ายระยะเวลาและการแก้ไขการส่งมอบงาน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติการขอย้ายระยะเวลาดำเนินงานและแก้ไขการส่งมอบงาน จักเป็น
พระคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ


(นางสาวอนริักษ์ อินชี่น)

กรรมการผู้จัดการ

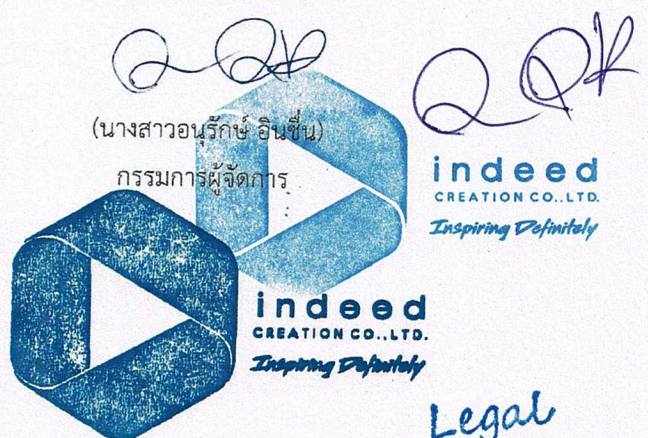

รายละเอียดการขอขยายระยะเวลาดำเนินงานและแก้ไขการส่งมอบงาน

รายละเอียดเดิม	ระยะเวลาเดิม	รายละเอียดใหม่	ระยะเวลาใหม่
ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ภายในระยะเวลา 180 วัน นับถัดจาก วันที่ทำสัญญา	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ภายในระยะเวลา 270 วัน นับถัดจาก วันที่ทำสัญญา
ครั้งที่ 2 รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) ประกอบด้วย - รายงานสรุปผลการลงพื้นที่เพื่อ สํารวจชุมชน อย่างน้อย 20 ชุมชน - ร่างรายละเอียด Mood & Tone ของ VDO	ภายใน 120 วัน นับ ถัดจากวันที่ทำ สัญญา	ครั้งที่ 2 รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) ประกอบด้วย - รายงานสรุปผลการลงพื้นที่เพื่อ สํารวจชุมชน อย่างน้อย 20 ชุมชน - ร่างรายละเอียด Mood & Tone ของ VDO	ภายใน 270 วัน นับ ถัดจากวันที่ทำ สัญญา
ครั้งที่ 3 ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) ประกอบด้วย - รายงานสรุปผลการลงพื้นที่เพื่อ สํารวจชุมชนทั้งหมด 40 ชุมชน - รายงานสรุปผลการประชุมเชิง ปฏิบัติการ - ร่างคู่มือ เพื่อประชาสัมพันธ์ (ภาษาไทย) - ร่างสตอรี่บอร์ดของ VDO	ภายใน 150 วัน นับ ถัดจากวันที่ทำ สัญญา	ครั้งที่ 3 ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) ประกอบด้วย - รายงานสรุปผลการลงพื้นที่เพื่อ สํารวจชุมชนทั้งหมด 40 ชุมชน - รายงานสรุปผลการประชุมเชิง ปฏิบัติการ - ร่างคู่มือ เพื่อประชาสัมพันธ์ (ภาษาไทย) - ร่างสตอรี่บอร์ดของ VDO	ภายใน 270 วัน นับ ถัดจากวันที่ทำ สัญญา
ครั้งที่ 4 รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ประกอบด้วย - รายงานสรุปผลโครงการ ทั้ง 20 ชุมชน และแนวทางสำหรับการ ประชาสัมพันธ์และขายชุมชน สำหรับการจํัดกิจกรรมไมซ์ - เอกสารและสื่อประชาสัมพันธ์ ซึ่งประกอบด้วย คู่มือ และ VDO ตามรายละเอียดข้อ 6.2	ภายใน 180 วัน นับ ถัดจากวันที่ทำ สัญญา	ครั้งที่ 4 รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ประกอบด้วย - รายงานสรุปผลโครงการ ทั้ง 20 ชุมชน และแนวทางสำหรับการ ประชาสัมพันธ์และขายชุมชน สำหรับการจํัดกิจกรรมไมซ์ - เอกสารและสื่อประชาสัมพันธ์ ซึ่งประกอบด้วย คู่มือ และ VDO ตามรายละเอียดข้อ 6.2	ภายใน 270 วัน นับ ถัดจากวันที่ทำ สัญญา



๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรียน นางสาวอนุรักษ์ อินชิน
กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินดีดครีเอชั่น จำกัด

อ้างถึง หนังสือบริษัท อินดีดครีเอชั่น จำกัด ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท อินติตครีเอชั่น จำกัด ได้แจ้งขอขยายระยะเวลา และระยะเวลาส่งมอบงานการดำเนินงานกิจกรรมการยกระดับความพร้อมพื้นที่ชุมชนสหกรณ์เพื่อรองรับลูกค้ากลุ่มไมซ์ (ไมซ์เพื่อชุมชน) ในสัญญาออกไปอีก ๙๐ วัน เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ ส่งผลให้การเดินทางสำรวจพื้นที่ระหว่างจังหวัดล่าช้ากว่าแผนดำเนินโครงการที่วางไว้ โดยขยายระยะเวลาจากเดิมกำหนดส่งมอบงานภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันที่ทำสัญญา เป็นกำหนดส่งมอบงานภายใน ๒๗๐ วัน นับถัดจากวันที่ทำสัญญา นั้น

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ได้พิจารณาแล้วและเห็นสมควรขยายระยะเวลา และระยะเวลาส่งมอบงานการดำเนินกิจกรรมการยกระดับความพร้อมพื้นที่ชุมชนสหกรณ์เพื่อรองรับลูกค้ากลุ่มไมซ์ (ไมซ์เพื่อชุมชน) อ้างอิงสัญญาจ้างเลขที่ ๖๔-๐๒๓ จากเดิมส่งมอบงานภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันที่ทำสัญญา เป็นกำหนดส่งมอบงานภายใน ๒๗๐ วันนับถัดจากวันที่ทำสัญญา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


ขอแสดงความนับถือ

(นายจิรุตม์ อิศรางกูร ณ อยุธยา)

ผู้อำนวยการ

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
ผู้ประสานงาน : นายคณตภัทร ใหญ่จิตร โทรศัพท์ ๐๒-๖๔๔-๖๐๐๐ ต่อ ๒๐๓๔



องค์การมหาชน)



indeed
CREATION CO., LTD.
Inspiring Definitely
